

# 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目 财政支出绩效评价报告

鲁舜绩评字（2022）第 3701009 号

委托单位：枣庄高新技术产业开发区财政金融局

项目主管部门：枣庄高新技术产业开发区国土住建局

评价机构：山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2022 年 05 月 31 日


一、项目基本概况			
项目名称	蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目		
项目主管部门	枣庄高新技术产业开发区国土住建局		
项目地址	枣庄高新区蟠龙河南支（西起复元路、东至复兴路）		
项目评价期间	2021年01月至2021年12月		
项目预算资金（万元）	1300.00	实际到位资金（万元）	1300.00
其中：市级财政资金		其中：市级财政资金	
区级财政资金	1300.00	区级财政资金	1300.00
其他		其他	
实际支出（万元）	932.29		
二、项目绩效情况			
	预 期	实 际	
项目绩效目标及实施计划完成情况	蟠龙河南支的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、木桩护坡、道路铺装、防腐木铺装、绿化、活动广场及其他民生配套设施建设等。	完成对蟠龙河二期迁建项目附着物清理（兴仁街道）、宁波路北段项目用地补偿（张范街道）、大吕巷村（新城街道）征地及附着物补偿相关工作。	

一级	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
投入	15	项目立项	11	项目立项规范性	3	2.70
				绩效目标科学性	8	6
		资金到位	2	资金到位率	2	2
				资金到位时效	2	2
过程	25	业务管理	15	管理制度有效性	11	4
				项目质量可控性	4	4
		财务管理	10	管理制度	4	4
				资金使用	6	5.42
产出	25	项目产出	25	项目数量完成情况	15	15
				项目质量情况	6	3.25
				项目时效完成情况	2	0
				项目成本情况	2	0
效益	35	项目效益	35	经济效益	8	4
				社会效益	8	6
				生态效益	8	8
				可持续影响	3	3
				满意程度	8	6
得分	75.37					
评价等级	评价等级：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差					中

### 三、评价人员


姓 名	职 称	单 位
王玉立	注册会计师 资产评估师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
狄延祥	注册会计师 注册造价工程师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
赵 鹏	税务师 高级会计师	山东舜天兆信工程项目管理有限公司
孙 波	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
朱开英	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
杨居承	公估师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)
满建滕	会计师	山东舜天信诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

填报人(签字):



2022 年 05 月 31 日

评价组组长(签字):



2022 年 05 月 31 日

中介机构负责人(签字并盖章):




2022 年 05 月 31 日

# 目 录

一、项目基本情况.....	1
(一) 项目立项.....	1
(二) 项目绩效目标.....	2
(三) 项目预算.....	3
(四) 项目计划实施内容.....	3
(五) 项目组织管理.....	5
二、绩效评价情况.....	6
(一) 评价目的.....	6
(二) 评价对象与范围.....	6
(三) 评价依据.....	7
(四) 评价原则、评价方法.....	8
(五) 评价指标体系.....	9
(六) 评价人员组成.....	10
(七) 评价工作过程.....	11
三、评价结论.....	12
四、绩效评价指标分析情况.....	13
(一) 项目投入分析.....	13
(二) 项目过程分析.....	15
(三) 项目产出分析.....	17
(四) 项目效益分析.....	20
五、项目存在的主要问题.....	22
六、对今后工作的建议.....	23
七、其他需要说明的问题.....	24
附件.....	25

# 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目

## 财政支出项目绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目立项

##### 1、项目立项的背景

党的十九大报告提出：坚持人与自然和谐共生，建设生态文明是中华民族永续发展的百年大计。必需树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，坚持节约资源和保护环境的基本国策，像对待生命一样对待生态环境，统筹山水林田湖草系统治理，实行最严格的生态环境保护制度，形成绿色发展方式和生活方式，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，建设美丽中国，为人民创造良好生产生活环境，为全球生态安全作出贡献。报告强调的“大力推进生态文明建设”，给项目建设提供了重要契机，蟠龙河南支及宏图河水利提升改造是枣庄高新区生态文明建设重要的组成部分。结合枣庄高新区水系实际情况，以水生态修复、水质净化为理念，通过整滩疏浚、生态修复、生态护岸以植物配置等措施，加快构建高新区“水清、岸绿、景美、人水和谐”的生态环境，为高新区生态文明建设提供坚实的支撑和保障。

本项目以枣庄高新技术产业开发区国土住建局为项目主管单

位，枣庄高新财金投资控股集团有限公司为项目法人实施部门，组织实施了“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”。

为了规范和加强“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”项目的专项财政资金绩效目标管理，提出加强专项资金绩效管理的意见，切实提高资金使用效益，枣庄高新区财政金融局委托我公司对“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”项目进行绩效评价。

## 2、项目立项依据

《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发[2013]23号）；

《山东省政府印发的<山东省重点水利工程建设实施方案>》（鲁政字[2019]189号）；

《山东省水利厅关于加快重点水利工程开工复工的通知》（鲁水建字[2020]1号）；

《枣庄市城市总体规划》；

《枣庄市十三五城乡水务发展规划》。

## （二）项目绩效目标

### 1、总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快推进城市河道治理工程实施，坚持治管并重，消除安全隐患，建立健全常态化管理机制，提升运行管护能力和水平，清淤疏浚、蓄水防汛、根治水患，实现河道安全良性运行。

### 2、具体目标

本项目具体目标是：通过对蟠龙河南支（西起复元三路、东至复兴路）的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、木桩护坡、道路铺装、防腐

木铺装、绿化、活动广场及其他民生配套设施建设，加快构建高新区“水清、岸绿、景美、人水和谐”的生态环境，蓄水防汛、根治水患、为高新区生态文明建设提供坚实的支撑和保障。

### 3、绩效指标设定情况

枣庄市高新技术产业开发区国土住建社会事业局提供的本项目绩效目标申报表中指标设定值详见表 1。

表 1 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目  
绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出指标	项目产出	数量指标	年度改造任务	5 千米
		时效指标	施工任务是否按时进行	按时
		质量指标	按照时间节点完成施工任务	是
		成本指标	2021 年度预计拨款	3000 万
效果指标	项目效益	经济效益	拉动相关产业发展、促进人口就业	是
		社会效益	保证河道得到有效治理	是
		生态效益	提升环境污染防治	是
		可持续影响	促进水资源可持续利用，稳步提升环境保护	是
		社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95%

### (三) 项目预算

2021 年度“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”区级财政预算资金 1300 万元。

### (四) 项目计划实施内容



## 1、项目立项时间

本次绩效评价项目是枣庄高新财金投资控股集团有限公司于2020年02月25日在山东省投资项目在线审批监管平台备案、对项目进行立项备案；枣庄市生态环境局高新区分局于2020年03月06日下达《枣庄市生态环境局高新区分局关于枣庄高新财金投资控股集团有限公司蟠龙河南支及宏图河提升改造工程环境影响报告表的批复意见》（枣高环行审[2020]B-6号）文件，对项目环评影响作出许可批复；枣庄市自然资源和规划局于2020年03月05日下达《关于蟠龙河南支及宏图河提升改造工程规划意见》（枣资规函[2020]48号）文件，对项目规划选址作出许可批复；枣庄市高新区国土住建社会事业局于2020年03月05日下达《关于蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程土地预审意见》（枣高国土住建字[2020]20号）文件，对项目用地作出许可批复。

## 2、项目批复单位

本次绩效评价项目批复单位为枣庄高新技术产业开发区国土住建局。

## 3、项目计划实施具体内容

本次绩效评价项目计划实施具体情况为：蟠龙河南支的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、木桩护坡、道路铺装、防腐木铺装、绿化、活动广场及其他民生配套设施建设等。项目预算资金1300万元，全部为枣庄市高新区区级财政资金。

## 4、项目所在区域

本次绩效评价项目所在区域是枣庄高新区蟠龙河南支（西起复元三路、东至复兴路）。

## 5、项目计划完成时间

按照项目实施进度计划要求，本次绩效评价项目计划实施日期是2020年08月20日至2020年12月18日。

### （五）项目组织管理

#### 1、项目组织管理架构及项目具体分工职责

为保证蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目有序推进实施，确保项目顺利完成，由枣庄高新技术产业开发区国土住建局为主管部门，负责争取上级资金、协调各单位进行配合等工作。本项目的建设实行项目法人责任制，由枣庄高新财金投资控股集团有限公司承办，负责项目具体实施改造工作。

#### 2、项目核心管理制度

为了顺利完成本项目，枣庄高新技术产业开发区国土住建局根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《山东省区财政资金和项目管理办法》（鲁财农[2017]61号）、《关于印发枣庄市区财政资金和项目实施细则的通知》（枣财农[2017]30号）等法律法规和相关规定制定了枣庄高新技术产业开发区国土住建局工作规则和管理制度，包括：1、工作职责：枣庄高新区国土住建社会事业局主要职责、局机关各科室主要职责、局长主要职责、班子其他成员主要职责。2、管理制度：请示汇报和内部协调制度、干部任免和考核制度、机关行政管理制度、首问责任制度、服务承诺制度、限时办结制度、政务公开制度、否定报备制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、学习制度、机关安全保卫制

度、卫生管理制度、质量管理制度等核心管理制度。

## 二、绩效评价情况

### （一）评价目的

为了进一步加强和改进预算管理，提高财政资金使用效益，围绕财政资金项目支出计划在 2021 年度达到的投入、过程、产出及效益，通过对项目申报、管理、完成、绩效、违规违纪情况的逐项分析，全面评价“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”实现情况，查找项目管理中存在的问题，总结工作经验，以推动项目效益的持续提升，促进财政资金绩效最大化显现。

### （二）评价对象与范围

#### 1、评价对象

本次绩效评价项目评价对象是 2021 年度枣庄高新技术产业开发区财政金融局安排的专项财政资金的使用绩效情况。

#### 2、评价范围

本次绩效评价项目评价范围为蟠龙河南支的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、木桩护坡、道路铺装、防腐木铺装、绿化、活动广场及其他民生配套设施建设等。

#### 3、评价基准日

本次绩效评价项目的评价基准日为 2022 年 05 月 26 日。

#### 4、评价的主要内容

（1）项目申报情况：主要评价项目申请内容、绩效目标设定情况；

（2）项目管理情况：主要评价管理制度建设、资金投入使用、项目工作开展、管理机制创新；

(3) 项目完成情况：主要评价项目完成数量、完成质量、完成时效、完成成本情况；

(4) 项目绩效情况：主要评价项目实现的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度；

(5) 违规违纪情况：主要评价被监察、审计、财政监督检查机构等查处或被媒体曝光、群众举报等经查实的违规违纪行为。

本次绩效评价是在项目执行单位绩效自评的基础上，由山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对所涉及的项目资料进行书面评审，同时为了确认项目真实性对蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目进行现场评价，现场评价范围涵盖整个项目区域，涉及财政资金 1,300.00 万元，占项目总数比例 100%，占资金总额比例 100%。

### （三）评价依据

《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预[2013]53号）；

《关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》（财预便[2017]44号）；

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发[2018]34号）；

《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发[2019]21号）；

《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）；

《国务院办公厅关于做好城市排水防涝设施建设工作的通知》（国办发[2013]23号）；

《山东省政府印发的<山东省重点水利工程建设实施方案>》  
(鲁政字[2019]189号);

《山东省水利厅关于加快重点水利工程开工复工的通知》(鲁水建字[2020]1号);

《枣庄市城司总体规划》;

《枣庄市十四五城乡水务发展规划》;

《水利工程项目验收管理规定》;

《政府采购管理流程》;

《固定资产管理流程》;

《政府会计准则第5号-公共基础设施》。

#### (四) 评价原则、评价方法

##### 1、评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序,按照科学可行的要求,采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。在评价项目产出和项目效果时,将项目产出与绩效目标核对,评价项目产出的情况,项目提前完成或未完成的原因是客观的还是主观的,需要做定性分析;通过问卷调查的方式,得出项目效益的指标分,被调查对象不满意的地方反映出项目实施过程中仍存在的问题。

(2) 绩效相关原则。项目的实际投资与项目绩效之间存在相关性,评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的对应关系。

(3) 政策相符原则。制定的评价工作方案、现场评价表格及项目评价的实施,均应严格执行有关政策和管理的规定。评价组在制定评价工作方案时,严格相关文件规定,现场核实表和调查问卷也

是依据项目实施的内容而设置的，项目评价实施工作依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）文件要求开展。

（4）经济合理原则。现场评价点以高新区兴城街道蟠龙河南支为项目现场，但满意度现场调查个数的抽取在满足委托要求及实际评价需要的同时，也考虑到线路往返的成本问题，充分体现了经济合理的原则。

（5）依据充分原则。评价组得出评价结论的依据是充分的。绩效评价报告中项目计划及资金的确定与调整、项目产出验收和项目效益等保证依据充分。评价机构以正式程序得到的资料和信息为评价依据，非正式程序所提交的资料仅作参考。

## 2、评价方法

根据项目的不同特点，并根据现场调研具体实施情况，本次评价采用以方法：

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（4）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

### （五）评价指标体系

根据本次绩效评价项目特点，结合枣庄高新技术产业开发区财政金融局预算绩效管理科重点项目绩效评价指标体系，在与枣庄高

新技术产业开发区国土住建局项目相关人员充分讨论后，在绩效评价专家监督把关下制定该绩效评价指标体系。

评价指标体系：本次绩效评价指标总标准分值为 100 分，包括投入、过程、产出、效果四个一级指标，项目立项、资金到位、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益六个二级指标、十七个三级指标和四十二个四级指标。（具体见附件 1：“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价指标体系）。


### （六）评价人员组成

根据项目特点及工作方案要求确定评价组成员，项目小组负责人及外聘专家 2 人、项目督导组 1 人及评价组成员 4 人，共计 7 人。评价组成员大部分参加过 2017-2021 年绩效评价项目。具体人员安排如表所示：

姓名	技术资格或专业	工作职务	项目组分工
王玉立	注册会计师 资产评估师	项目负责人	负责督导组长 报告复核
狄延祥	注册会计师 造价工程师	督导组经理	督导项目工作进度
赵鹏	税务师 高级会计师	山东舜天兆信工程 项目管理有限公司	外聘专家 现场及非现场技术指导
孙波	会计师	评价组组长	整体负责项目 绩效评价报告撰写
朱开英	会计师	评价助理	负责项目绩效评价现场评 价、工程资料检查
杨居承	公估师	评价助理	负责项目资料收集 现场评价
满建滕	会计学	评价助理	负责项目资料收集 现场评价

项目相关成员按工作职责划分为三组，分别为项目督导组、专

家组、评价组，具体分工如下图所示：

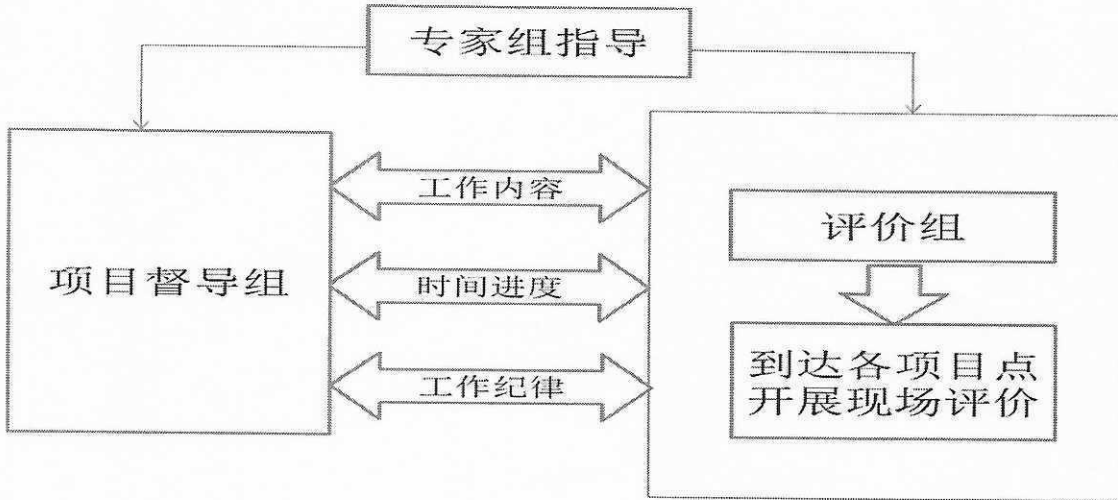

### (七) 评价工作过程

绩效评价工作主要经过了前期准备工作、方案设计、项目单位自查、实施评价、撰写报告及提交审核六个过程。

前期准备工作：成立绩效评价工作组，与各有关部门沟通，撰写需要提供绩效评价资料清单，并通知被评价单位准备相关材料。

方案设计：经对被评价项目初步了解后，设计绩效评价指标体系，按照评价要求制定具体评价实施方案并报区财政金融局审定。

项目单位自查：项目单位开展自查自评，编写自评绩效报告。

实施评价：绩效评价工作采用书面评价（非现场评价）和现场评价相结合的方式，并以现场评价为主，书面评价为辅的方式。根据项目单位实际情况调整绩效评价指标体系。

撰写报告及提交审核：在依据充分、数据真实的基础上，按照规定的文本格式和协议要求撰写绩效评价报告。整理相关资料，初步形成绩效评价报告，并与被评价单位沟通，经专家论证，各方无异议后，交由枣庄高新技术产业开发区财政金融局审核。针对财政金融局的复核意见，补充相关资料，形成最终报告。



### 三、评价结论


通过书面评价及现场评价取得的信息，使用评价小组编制的项目评价指标体系和评分标准，得出本项目绩效评价得分为 75.37 分，评价等级为中。其中：项目投入类指标权重为 15 分，得分为 12.70 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 17.42 分；项目产出类指标权重为 25 分，得分为 18.25 分；项目效益类指标权重为 35 分，得分为 27 分。（详见表 3）

表 3 “蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”项目  
绩效评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 26 日

分值 名称	项目投入	项目过程	项目产出	项目效益	合计
	主管部门	15	25	25	35
枣庄高新技术产业开发区 国土住建局	12.70	17.42	18.25	27	75.37
评价等级	中				

评价分析对比表

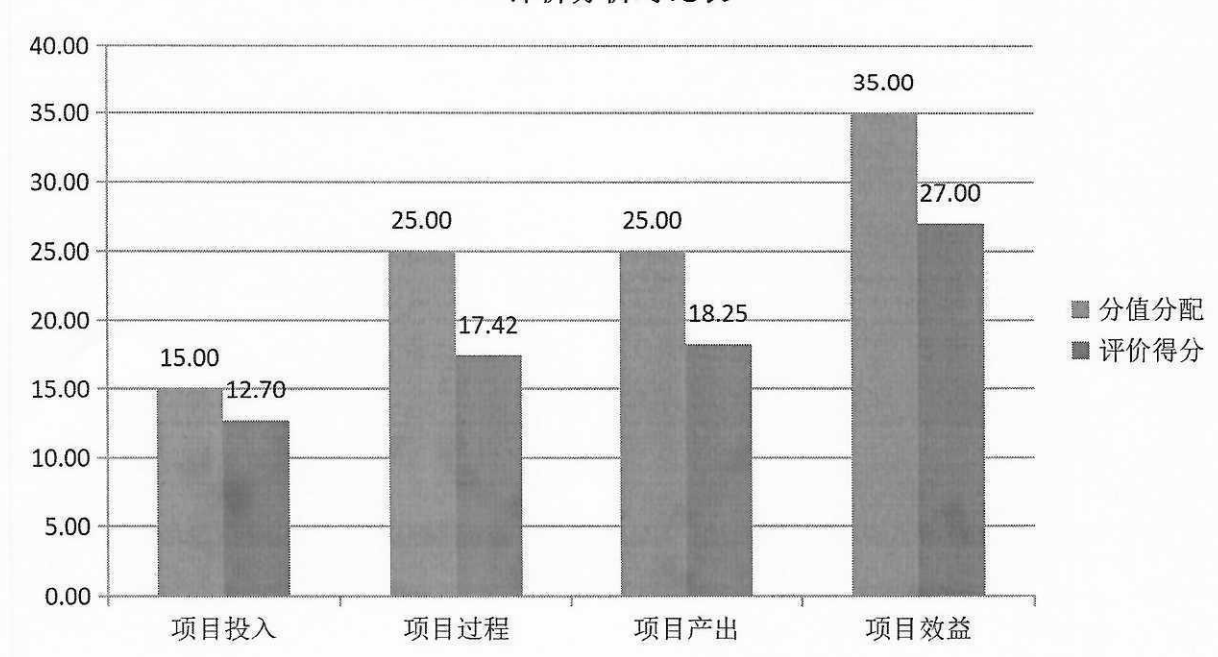

#### 四、绩效评价指标分析情况


##### (一) 项目投入分析 (详见表 4)

表 4 “蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”项目  
投入类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 26 日

分值	名称	项目立项规范性	绩效目标科学性	资金到位	合计
主管部门		3	8	4	15
	枣庄高新技术产业 开发区国土住建局	2.70	6	4	12.70

项目投入类指标评价得分图

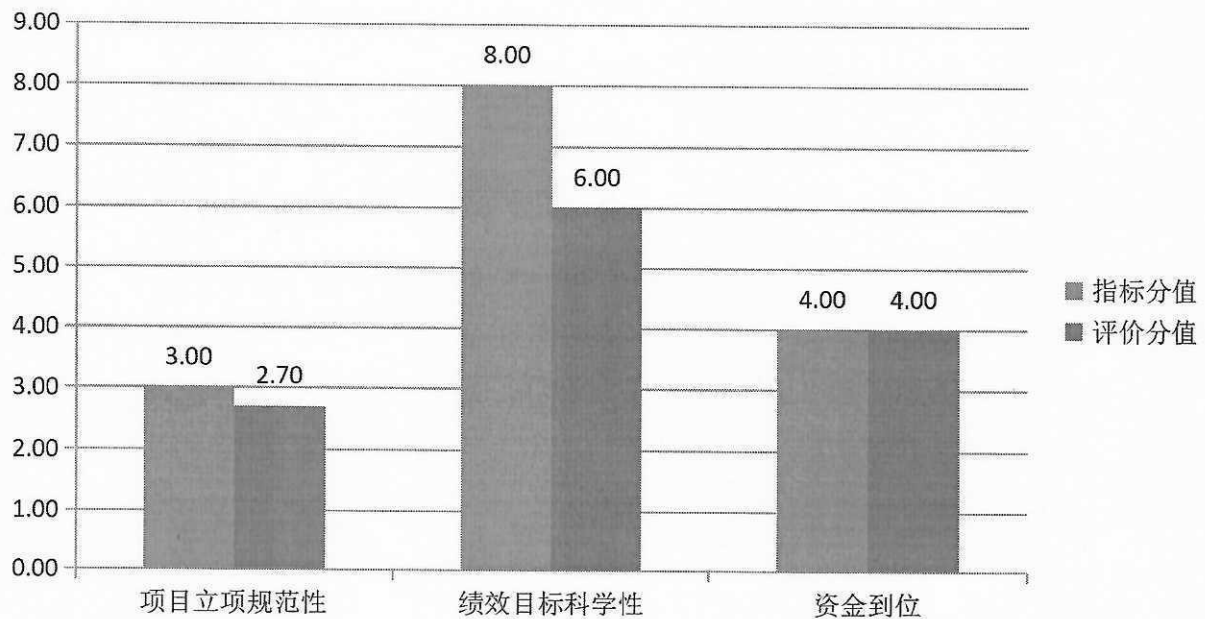

#### 1、项目立项分析

##### (1) 项目立项规范性

蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目，是枣庄高新技术产业开发区国土住建局根据《山东省政府印发的<山东省重点水利工程建设实施方案>》（鲁政字[2019]189号）等文件要求于2020

年 02 月对项目进行立项申请及备案。立项按照程序执行，项目立项文件符合文件要求，项目立项文件合理，项目立项程序未经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估，根据评分标准规定，此项扣 0.30 分。

此项分值 3.00 分，评价得分为 2.70 分。

## (2) 绩效目标科学性

根据《山东省政府印发的〈山东省重点水利工程建设实施方案〉》（鲁政字[2019]189 号）文件要求，蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国家经济发展规划。所设定的绩效目标与项目主管单位即枣庄高新技术产业开发区国土住建局职责密切相关。项目设置的绩效目标和中标通知书中的内容存在差异，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置的绩效指标细化、量化程度较低，定性指标过多，内容未做到清晰合理。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 6.00 分。

## 2、资金到位分析

### (1) 资金到位率（详见表 5）

表 5 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目  
财政预算资金拨付到位情况表

评价基准日：2022 年 05 月 26 日

项目主管部门	资金来源	预算金额 (万元)	实际支付金额 (万元)
枣庄高新技术产业开发区国土住建局	财政预算资金	1,300.00	932.29

本次绩效评价项目本年度财政预算资金 1,300.00 万元，全部是区级财政资金。根据评价小组收集的相关财务资料显示，资金已全部到位，资金到位率为 100.00%。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

(2) 资金到位时效

根据评价小组收集的相关财务资料显示，该项目资金及时到位，为项目实施提供了有效的资金保障。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。


(二) 项目过程分析 (详见表 6)

表 6 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目  
过程类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 26 日

分值	名称	管理制度有效性	项目质量可控性	管理制度	资金使用	合计
		主管部门	11	4	4	6
	枣庄高新技术产业 开发区国土住建局	4	4	4	5.65	17.65

项目过程类指标评价得分图



### (1) 业务管理制度有效性

枣庄高新技术产业开发区国土住建局建立了工作规则和管理制度，包括：1、工作职责：枣庄高新技术产业开发区国土住建局主要职责、局机关各科室主要职责、局长主要职责、班子其他成员主要职责。2、管理制度：请示汇报和内部协调制度、干部任免和考核制度、机关行政管理制度、首问责任制度、服务承诺制度、限时办结制度、政务公开制度、否定报备制度、失职追究制度、公文管理制度、考勤制度、财务管理制度、机关车辆管理制度、接待管理制度、廉政建设制度、会议制度、学习制度、机关安全保卫制度、卫生管理制度、质量管理制度等制度。这些制度涉及项目组织、建设和奖惩办法等方面，完整全面，合法合规。项目在各项实施条件已具备的情况下实施。项目实施过程中，设有管理管护人员，管护人员履职到位，权责清晰。项目资产项目未建立有效的进度控制计划和措施，计划进度与实际进度不符，扣 1.00 分；项目未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施，扣 2.00 分；项目调整未提供申请手续，扣 2.00 分；项目档案资料不齐全，部分档案不规范且归档不及时，扣 2.00 分。

此项分值 11.00 分，评价得分为 4.00 分。

### (2) 项目质量可控性

在项目质量可控性方面，该项目按照具有的项目质量标准进行了全面的检查，经项目主管单位、项目法人单位、监理单位、设计单位、运行管理单位、质量监督单位相关人员对已完工部分进行了相关检验，手续基本完备。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

## 2、财务管理

### (1) 管理制度

本项目的部门主管部门枣庄高新技术产业开发区国土住建局根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位内部控制规范(试行)》等法律法规和相关规定制定了相关财务管理制度、质量管理制度等管理制度。财务管理制度符合相关财务会计制度的相关规定。项目财务监管措施和监管制度健全，并真实有效，会计核算规范。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

### (2) 资金使用

本项目资金全部为区级财政预算资金，专项资金的使用范围、支出依据合理，资金审批、支付手续、支付程序、支付进度规范。项目实际支出金额与预算划拨金额存在差异，项目资金支出符合性存在差异。根据评分标准规定，此项扣 0.58 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 5.42 分。

### (三) 项目产出分析


表 7 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目

#### 产出类指标评分结果

评价基准日：2022 年 05 月 26 日

分值	名称	项目数量	项目质量	项目实效	项目成本	合计
		主管部门	15	6	2	2
	枣庄高新技术产业开发区国土住建局	15	3.25	0	0	18.25

项目产出类指标评价得分图

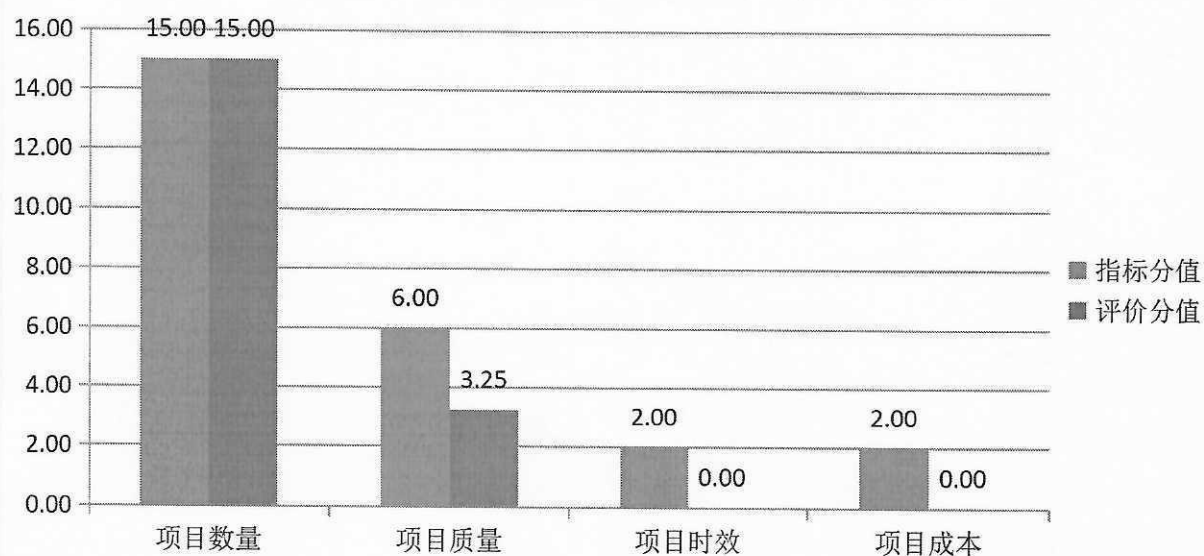

蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目产出情况（详见表 8）

表 8 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目  
工程产出情况表

评价基准日：2022 年 05 月 26 日

序号	项目名称	计量单位	计划完成	实际完成	备注
1	土方开挖	万立方米	19	19	已完成
2	石方开挖/破碎	万立方米	18	18	已完成
3	河道清淤	万立方米	1.2	1.2	已完成
4	碎石回填	吨	5000	5000	已完成
5	河道防渗	平方米	90000	90000	已完成
6	橡胶坝	米	56.67	56.67	已完成
7	泵房	座	3	3	已完成
8	支流闸口	座	2	2	已完成
9	园路铺装	平方米	2000	2000	已完成

## 1、项目产出

### (1) 项目数量完成情况

根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录，具体计划及完成情况对比如下：

计划完成：土方开挖 19 万立方米；石方开挖/破碎 18 万立方米；河道清淤 1.2 万立方米；碎石回填 5000 吨；河道防渗 90000 平方米；橡胶坝建设 56.67 米；泵房 3 座；支流闸口 2 座；园路铺装 2000 平方米。

实际完成：土方开挖 19 万立方米；石方开挖/破碎 18 万立方米；河道清淤 1.2 万立方米；碎石回填 5000 吨；河道防渗 90000 平方米；橡胶坝建设 56.67 米；泵房 3 座；支流闸口 2 座；园路铺装 2000 平方米。

项目实际完成工程量总体达到计划完成工程量。

此项分值 15.00 分，评价得分为 15.00 分。

### (2) 项目质量情况

根据查阅项目资料记录，截止评价基准日，由项目主管单位、项目法人单位、监理单位、设计单位、运行管理单位、质量监督单位相关人员正在进行联合验收。绩效评价小组经现场勘验，发现河道两侧缺少安全防护警示牌、防护栏等安全防护设施，存在一定程度的安全隐患，此项扣 1.50 分。根据工程预结算书，已完工工程造价 4,656.33 万元，施工合同预计总工程量约 8000 万元，此项扣 1.25 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 3.25 分。

### (3) 项目时效完成情况



根据评价小组的现场勘查和查阅项目资料记录显示，该项目计划于2020年12月18日完成工程施工，截止评价基准日，项目尚未完成竣工验收手续。根据评分标准规定，此项扣2.00分。

此项分值2.00分，评价得分为0.00分。

(4) 项目成本情况

本次绩效评价项目计划成本为1,300.00万元，截至2021年12月31日，实际支付进度工程款932.29万元，项目预算执行率71.71%。根据评分标准规定，此项扣2.00分。

此项分值2.00分，评价得分为0.00分。


(四) 项目效益分析（详见表9）

表9 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目  
项目效益类指标评分结果

评价基准日：2022年05月26日

分值	名称	经济效益	社会效益	生态效益	可持续影响	满意程度	合计
		主管部门	8	8	8	3	8
	枣庄高新技术产业 开发区国土住建局	4	6	8	3	6	27

项目效益类指标评价得分图

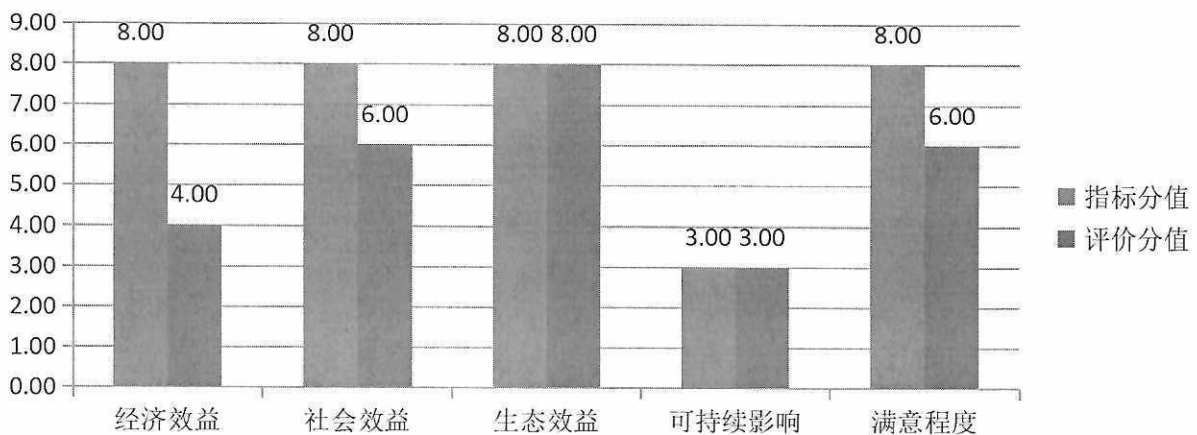

### 1、经济效益

通过评价组实地现场问询调研发现，本次绩效评价项目，能够在一定程度上增加当地的就业岗位、提高相关行业人员经济收入水平，对当地经济发展有一定的促进作用，产生了较为明显的间接的经济效益。根据评分标准规定，此项扣 4.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 4.00 分。

### 2、社会效益

通过评价组实地问询调研和对受益群众满意度统计分析发现，蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目可以在一定程度上消除河道淤堵，提升蟠龙河南支及宏图河整体的防洪除涝水平及减少河道两岸存在的安全隐患，对加强河道的安全度、增强河道两岸居民的安全系数、提升水利工程形象、改善周边经济建设和人居环境有一定的促进作用，对扩大高新区的城市影响力有一定的积极效果。根据评分标准规定，此项扣 2.00 分。

此项分值 8.00 分，评价得分为 6.00 分。

### 3、生态效益

通过评价组实地问询调研发现，本项目能够明显的美化、优化、改善河流沿线的生态环境，对城市生态环境的有序重组起到了积极有效的效果。

此项分值 8.00 分，评价得分为 8.00 分。

### 4、可持续影响

通过评价组实地问询调研查阅资料发现，本项目即将竣工验收，后续维护管理制度健全，能够长期发挥效果。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

## 5、满意程度

为了解主管部门、受益群众对本项目的满意程度，评价小组共发放了150份调查问卷，实际回收有效问卷150份，经统计项目主管部门满意度为100%，满意度高。受益群众满意度为86.67%，基本满意。根据评分标准规定，此项扣2.00分。

此项分值8.00分，评价得分为6.00分。

## 五、项目存在的主要问题

根据评价小组的现场检查记录、查阅项目资料和专家论证意见，该项目存在以下问题：

### 1、项目实施立项程序方面

(1) 项目立项程序未经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估，项目实施立项程序不规范。

(2) 项目设置的绩效目标和中标通知书中的内容存在差异，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置的绩效指标细化、量化程度较低，定性指标过多，内容未做到清晰合理。

### 2、管理制度有效性方面

(1) 项目建立的进度控制计划和措施与实际进度不符。

(2) 项目实施未建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

(3) 项目档案资料不齐全、归档不及时，缺少必要的事前评估、专家论证、风险评估、绩效评估等档案资料。

(4) 项目调整未提供完整的申请、审批等项目变更资料。

(5) 项目实际支出金额与预算划拨金额存在差异，项目资金支出符合性存在不足。

### 3、项目质量完成情况方面

(1) 河道两侧缺少安全防护警示牌、防护栏等安全防护设施，存在安全隐患。

(2) 工程预决算完成工程量与项目整体计划完成工程量存在差异。

#### 4、项目时效完成情况方面

项目计划于 2020 年 12 月 18 日完成工程施工，截止评价基准日，项目尚未完成竣工验收手续。

#### 5、项目成本完成情况方面

项目计划成本为 1,300.00 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际支付项目工程款 932.29 万元，预算执行率 71.71%。

#### 6、项目效益方面

项目现场部分区域存在少量垃圾，项目资产管理及管护人员履行职责不到位，对周边生态环境产生一定不利影响。

7、项目主管部门及实施主体对项目绩效评价认识程度有待提升。

### 六、对今后工作的建议。

#### 1、项目实施立项程序方面

(1) 项目实施前应经过必要的专家论证、风险评估、绩效评估等程序。

(2) 项目设置的绩效目标应和中标通知书中的内容一致，项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置的绩效指标符合细化、量化要求，内容做到清晰合理。

#### 2、管理制度有效性方面

(1) 项目实施前应建立明确的进度控制计划和措施。

(2) 项目实施前应建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施。

(3) 项目调整变更资料应健全，资料应及时归档。

(4) 项目档案应及时整理归档，并指定专人保管。

### 3、项目生态效益方面

项目建设应改变重建轻养的意识，加强项目后期养护维护。

4、加强专项资金的管理，明确财务部门、各参与分配专项资金科室、项目承担单位等各方在预算绩效管理中的权责关系，确定责任主体。

5、加强对预算资金项目绩效评价宣传、培训学习，提升相关部门工作人员的绩效评价意识。

## 七、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价组成员、相关专家执业水平限制和被调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

二〇二二年五月三十一日

# 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目

## 附件目录

- 1、“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价指标体系
- 2、“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价得分表
- 3、调查问卷表
- 4、项目相关文件、制度
- 5、项目现场调查照片
- 6、其他

## “蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式	
投入 (15分)	项目立项 (11分)	项目立项规范性 (3分)	项目立项依据的相符性 (1分)	对项目立项申报条件与项目立项要求的相符程度进行评价	该项分值1分。对照有关文件要求,项目立项与主管部门下发的立项通知要求相符得1分,否则不得分。	立项办法或通知、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	立项办法、立项通知、项目可行性研究报告、立项申请文件、立项批复文件	案卷研究、互联网检索	
			项目立项文件的合理性 (1分)	对项目立项文件形式、内容是否合理进行评价	该项分值1分。项目立项文件、材料形式合规得0.5分;内容合规得0.5分。否则不得分。				
			项目立项程序的合规性 (1分)	对项目立项过程是否合规进行评价	该项分值1分。项目申报是否按照规定的程序申请设立,是得0.5分;事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策,缺一项扣0.1分。				
		绩效目标科学性 (8分)	绩效目标的政策相符性 (1分)	对项目的绩效目标是否符合相关政策进行评价	该项分值1分。项目所设定的绩效目标符合国家和相关法律法规、国民经济发展规划、部门发展规划政策与规划,得1分,否则酌情扣分。	项目目标和内容评价时,有关法律行政法规和社会发展规划、行业发展的战略和政策重点、部门职责	项目实施方案、计划书、任务书、责任书中列明的项目目标、相关法律法规、省市经济发展和行业发展规划、部门职责	案卷研究、互联网检索	
			绩效目标与项目单位职责的相关性 (1分)	对绩效目标是否与部门职责、承担单位职责密切相关进行评价	该项分值1分。项目绩效目标与部门职责、承担单位职责密切相关,得1分,否则酌情扣分。				
			绩效目标的必要性 (2分)	对绩效目标的是否促进水利事业发展所必须进行评价	该项分值2分。项目绩效目标的制定是根治水患所必须,得2分,否则酌情扣分。				
			绩效目标的业绩水平相符性 (2分)	对项目预期产出效益和效果是否符合正常业绩水平进行评价	该项分值2分。项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平,得2分,较符合,得1分,不符合,得0分。				
		资金到位 (4分)	资金到位率 (2分)	绩效目标细化、量化程度 (2分)	对绩效目标是否细化、量化进行评价	该项分值2分。项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了细化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则扣0.5分;项目绩效目标(含长期目标和年度目标)在数量、质量、成本、时效、效益等方面设置了量化的绩效指标,指标内容清晰合理,得1分,否则扣0.5分。	资金到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间、规定的到位数、到位时间	指标文、财政拨款凭证、资金到账凭证等、各级资金管理辦法	案卷研究、现场核查、凭证分析
				财政资金到位率 (2分)	对财政资金到位情况进行评价 评价(到位率=实际到位资金/计划投入资金×100%)	该项分值2分。指标分值=资金到位率*指标满分值2分,指标得分不超过2分。			
				财政资金到位及时性 (2分)	对财政资金到位及时性进行评价	该及时到位(2分),未时到到位但未影响项目进度(1分),未及时到到位并影响项目进度(0-1分)。			

# “蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式		
过程 (25分)	业务管理 (15分)	管理制度的健全性 (11分)	业务管理制度的健全性 (1分)	对项目单位是否建立健全的业务管理制度进行评价	该项分值1分。若项目单位业务管理制度健全得1分，否则酌情扣分；若项目单位未建立业务管理制度，则该三级指标得0分。	业务管理制度、内部控制制度、法律法规、政策与该业务有关的规定	业务管理制度、及内政部控制制度、国家法律、法规、政策	案卷研究、互联网检索		
			项目实施条件的落实情况 (1分)	对项目实施条件是否落实、是否达到实施的条件要求进行评价	该项分值1分。项目实施条件的落实情况好，得1分，否则酌情扣分。	人员安排情况、设施设备配置、运转情况	项目实施人员配备名单、现场设施设备等情况	项目实施人员配备名单、现场设施设备等情况	实地核查、电话调查、案卷研究	
			项目建立完善、执行有效的进度控制计划和措施 (1分)	对项目实施进度是否建立完善、执行有效的进度控制计划和措施进行评价	该项分值1分。项目单位日常进度能够按照规定的计划和措施执行，符合相关进度制度、措施，得1分，较符合，得0.5分，不符合，得0分。	项目进度制度、措施日常执行情况	项目进度制度、措施日常执行情况	项目单位相关进度计划、措施，项目实施的有关档案资料	项目单位相关进度计划、措施，项目实施的有关档案资料	实地核查、电话调查、案卷研究
			项目建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施 (2分)	对项目考核措施是否严格制定进行评价	该项分值2分。项目单位建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施，项目单位日常管理、项目的实施能够完全按照考核措施执行，符合相关法律法规，得2分，否则不得分。	考核措施日常执行情况	考核措施日常执行情况	项目单位相关考核制度、项目实施的有关档案资料	项目单位相关考核制度、项目实施的有关档案资料	实地核查、电话调查、案卷研究
			项目调整及支出调整手续的完备性 (2分)	对项目调整及支出调整是否按照规定程序和权限，并履行相应手续进行评价	该项分值2分。项目单位预算调整按照规定程序和权限进行，得1分，否则不得分；手续完备，资料齐全得1分，否则不得分。	项目任务、计划、预算数、实际建设完成情况、预算执行情况	项目任务、计划、预算数、实际建设完成情况、预算执行情况	项目实施方案、任务书、计划书、检查、验收报告、有关财务凭证、项目调整审批单	项目实施方案、任务书、计划书、检查、验收报告、有关财务凭证、项目调整审批单	实地核查、电话调查、案卷研究
			项目资产管理应当符合相关规定，管护人员应履职到位，权责清晰 (2分)	对项目资产管理是否有专人负责管理、管护人员履职情况进行评价	该项分值2分。项目资产管理有专人负责管理、管护人员履职符合要求，得2分，否则酌情扣分。	资产档案资料	资产档案资料	资产管理制度、资产资料	资产管理制度、资产资料	现场核查、案卷研究
			项目档案资料齐全并及时归档 (2分)	对项目档案资料是否齐全进行评价	该项分值2分。项目档案资料齐全并档案及时归档得2分，评价专家发现应有未有的资料，缺少一项扣0.2分，不合规一项扣0.1分，扣完为止。	项目档案目录、存档资料	项目档案目录、存档资料	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金管理制、拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	项目申报书、任务书、实施方案、合同、验收报告、资金管理制、拨付材料、管理制度、有关会议纪要等	现场核查、案卷研究
			制定或具有相应的项目质量要求或标准 (2分)	对项目是否具有完备的质量与标准要求评价	该项分值2分。项目具有完备的质量与标准要求，得2分，否则酌情扣分。	项目相关执行标准	项目相关执行标准	项目单位制定的质量标准、行业标准等	项目单位制定的质量标准、行业标准等	现场核查、案卷研究
			采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段 (2分)	对项目质量检查、验收等的管理控制情况进行评价	该项分值2分。项目单位采取了相应的项目质量检查、验收等措施，对项目质量检查、验收等的管理控制情况好，得2分，缺少一项扣0.5分，不规范一项扣除0.5分，扣完为止。	项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容	项目实际建设完成情况、实施方案、计划书列明的建设内容	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等	实施方案或任务书、督导检查记录、进度验收记录、验收报告等	现场核查、案卷研究



# “蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
产出 (25分)	项目产出 (25分)	项目质量情况 (6分)	制定或具有相应的项目资金管理 办法(2分)	对项目单位是否建立完善的 资金管理措施和制度进行评 价	该项分值2分。项目单位资金管理措施和制度健全,得2分,否则酌情扣分。	项目执行的资金管理 制度	项目单位制定的资金管理 办法	现场核查、 案卷研究
			项目财务管理措施和监管制度 健全,并落实有效,会计核算 规范(2分)	对财务监控机制是否健全、执 行有效进行评价	该项分值2分。财务监控措施与制度健全、执行有效得2分,否则酌情扣分。	财务凭证与记录	财务监控机制相关资料、财 务监控相关文件、财务相关管 理制度	
			资金使用合规性(2分)	对专项资金的使用范围、支 出依据是否合理进行评价	该项分值2分。支出依据不合规的,发现1处扣 0.5分;发现挤占、挪用、截留、改变用途问 题,扣2分。	资金使用和合规 性	专项资金管理办法, 项目单位支出凭证等 相关财务资料	现场核查、 案卷研究
			资金拨付合规性(2分)	对专项资金审批、拨付手 续,拨付程序,拨付进度是 否规范进行评价	该项分值2分。审批、拨付手续不够规范、程 序不够严谨,发现1处扣0.5分。	拨付流程	与专项资金拨付相关 的凭证和资料	
			项目资金支出的符合性(2分)	对资金支出是否符合项目的 要求,调整是否有完备的手 续进行评价	该项分值2分。得分=(项目实际使用资金/项 目拨付总资金)*100%*分值。	支出数、预算数 、支出进度、计 划支出进度	项目支出凭证、项目 预算文件等相关财务 资料	
			项目景观改造工程设计完成情 况(3分)	实际景观改造工程设计完成 情况/预期景观改造工程设计 完成情况×100%	该项分值4分。指标分值=完成比率*指标满分 值4分,指标得分不超过4分。如果完成比例低 于80%,该项不得分。	景观工程设计合 同、招投标资料	景观改造工程设计完 成等相关资料	
			征地区域补偿完成 情况(3分)	按计划顺利完成征地区域及附 着物补偿工作,无补偿纠纷。	顺利完成征地区域及附着物补偿工作,无补偿纠纷 得3分,否则得0分。	同级信访局信息 反馈	街道上附着物补偿 资料、无信访反馈信 息	现场核查、 案卷研究
			清淤疏浚完成 情况(3分)	按标准顺利完成清淤疏浚工 作。	按标准顺利完成清淤疏浚工作,否则得0分。	清淤疏浚工程 测量说明	清淤疏浚工程测量 说明	
			橡胶坝建设完成 情况(3分)	按标准顺利完成橡胶坝建设 工作。	按标准顺利完成橡胶坝建设工作,否则得0分 。	橡胶坝坝袋安 装工程验收申请	橡胶坝坝袋安 装工程验收申请	
			泵房建设完成 情况(3分)	按标准顺利完成泵房建设工 作。	按标准顺利完成泵房建设工作,否则得0分。 。	泵房建设施 工明细	泵房建设施 工明细	
施工质量情况(3分)	经现场勘察,无施工质量问 题及安全隐患。	经现场勘察,无施工质量及安全 隐患,得3分,存在施工质量问 题扣1.5分,存在安全 风险,扣1.5分,	评价组现场 测量、观测	评价组现场观 测资料				
工程完成率(3分)	实际工程完成数量/项目工 程规模×100%	该项分值3分。指标分值=项目完成比率*指 标满分3分。	项目施工 资料、评价 组现场观 测资料	项目施工档案、评 价组现场观 测资料	现场核查、 案卷研究			

# “蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程”绩效评价指标体系

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	四级指标及分值	指标解释	评价标准	依据	依据来源	证据收集方式
效益 (35分)	项目时效完成情况 (2分)	项目完成及时率 (2分)	项目完成及时率 (2分)	工程及时完成数量 / 项目总数 × 100%	按期完工, 指标分值=项目完成及时比率*指标满分值2分, 否则不得分。	项目施工资料、项目监理资料、项目验收资料等	项目施工档案、项目验收报告	案卷研究
				实际完成情况/预期完成情况 × 100%	该分项值2分。80% ≤ 实际支付金额/预算指标 * 100% ≤ 100%, 按比例得分, 否则不得分。	工程审计报告、评价专家认证、项目组现场搜集资料	工程审计报告、专家认证, 评价组现场搜集资料	案卷研究、互联网检索
	经济效益 (8分)	对经济发展的促进作用 (4分)	产生间接经济效益 (4分)	对项目产生的经济效益进行评价	该分项值4分, 能够有效促进当地经济社会发展, 得4分, 有所促进得2分, 促进不明显或无促进得0分。	调查问卷、项目实施情况	现场询问、调查、行业标准等	现场核查、案卷研究、互联网检索、座谈、经济分析等
				对社会水利事业发展的促进作用 (4分)	能有效增加就业岗位和提高收入得4分, 有所增加和提高得2分, 增加和提高不明显或无增加和提高得0分。	调查问卷、项目实施情况	现场询问、调查	行业专家意见表、项目实施记录、调研记录表
	社会效益 (8分)	水利工程形象提升情况 (4分)	对社会水利事业发展的促进作用 (4分)	对社会发展促进作用进行评价	促进明显得4分, 有所促进得2分, 促进不明显得0分	行业专家意见、项目实施情况、项目调查问卷	行业专家意见表、项目实施记录、调研记录表	现场核查、座谈等
				水利工程形象提升情况 (4分)	提升明显得4分, 有所提升得2分, 提升不明显得0分	行业专家意见、项目实施情况	查看现场环境、养护记录档案	现场核查、座谈等
	生态效益 (8分)	对社会生态发展的促进作用 (4分)	对周边生态环境变化影响情况 (4分)	对社会生态发展的促进作用 (4分)	促进明显得4分, 有所促进得2分, 促进不明显得1分	行业专家意见、项目实施情况	查看现场环境、养护记录档案	现场核查、座谈等
				对周边生态环境变化影响情况 (4分)	该分项值4分, 改善明显得4分, 有所改善得2分, 改善不明显得0分。	行业专家意见、项目实施情况	查看现场环境、养护记录档案	现场核查、座谈等
	可持续影响 (3分)	使用期限 (3分)	对社会公众或服务对象满意度 (8分)	对可持续影响情况进行评价	能够持续影响得3分, 否则酌情扣分。	行业专家意见、项目实施情况	查看项目档案、现场检查、调研记录	现场核查、案卷研究、互联网检索
				对社会公众满意度 (4分)	该分项值4分, 整体满意度 ≥ 90% 为较高得4分; 80%-90% (含80%) 为基本满意得2分; 80% 以下为较低得0分	社会公众意见、建议	问卷调查表、电话、网络调查记录表、座谈记录	问卷调查、电话、网络调查、座谈
社会效益 (8分)	主管部门满意度 (4分)	对主管部门满意度进行评价	对主管部门满意度进行评价	该分项值4分, 整体满意度 ≥ 90% 为较高得4分; 80%-90% (含80%) 为基本满意得2分; 80% 以下为较低得0分	主管部门意见、建议	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、座谈	
			对主管部门满意度进行评价	该分项值4分, 整体满意度 ≥ 90% 为较高得4分; 80%-90% (含80%) 为基本满意得2分; 80% 以下为较低得0分	主管部门意见、建议	问卷调查表、座谈记录	问卷调查、座谈	

附件2:

“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价得分表

指标				分值	枣庄高新技术产业开发区国土住建局
合计				100.00	75.37
一、投入				15.00	12.70
(一) 项目立项				11.00	8.70
1、项目立项规范性				3.00	2.70
		(1)	项目立项依据的相符性	1.00	1.00
		(2)	项目立项文件的合理性	1.00	1.00
		(3)	项目立项程序的合规性	1.00	0.70
2、绩效目标科学性				8.00	6.00
		(1)	绩效目标的政策相符性	1.00	1.00
		(2)	绩效目标与项目单位职责的相关性	1.00	1.00
		(3)	绩效目标的必要性	2.00	2.00
		(4)	绩效目标的业绩水平相符性	2.00	1.00
		(5)	绩效目标细化、量化程度	2.00	1.00
(二) 资金落实				4.00	4.00
1、资金到位率				2.00	2.00
		(1)	财政资金到位率	2.00	2.00
2、资金到位时效				2.00	2.00
		(1)	财政资金到位及时性	2.00	2.00
二、过程				25.00	17.42
(一) 业务管理				15.00	8.00
1、管理制度有效性				11.00	4.00
		(1)	业务管理制度的健全性	1.00	1.00
		(2)	项目实施条件的落实情况	1.00	1.00
		(3)	项目建立完善、执行有效的进度控制计划和措施	1.00	0.00

“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价得分表

指标				分值	枣庄高新技术产业开发区国土住 建局
合计				100.00	75.37
		(4)	项目建立完善、可量化、易反馈的绩效考核措施	2.00	0.00
		(5)	项目调整及支出调整手续的完备性	2.00	0.00
		(6)	项目资产管理应当符合相关规定，管护人员应履职到位，权责清晰	2.00	2.00
		(7)	项目档案资料齐全并及时归档	2.00	0.00
	2、项目质量可控性			4.00	4.00
		(1)	制定或具有相应的项目质量要求或标准	2.00	2.00
		(2)	采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控	2.00	2.00
	(二) 财务管理			10.00	9.42
	1、管理制度			4.00	4.00
		(1)	制定或具有相应的项目资金管理办法	2.00	2.00
		(2)	项目财务监管措施和监管制度健全，并落实有效，会计核算规范	2.00	2.00
	2、资金使用			6.00	5.42
		(1)	资金使用合规性	2.00	2.00
		(2)	资金拨付合规性	2.00	2.00
		(3)	资金支出的符合性	2.00	1.42
	三、产出			25.00	18.25
	1、项目数量完成情况			15.00	15.00
		(1)	项目景观改造工程设计完成情况	3.00	3.00
		(2)	征地及附着物补偿完成情况	3.00	3.00
		(3)	清淤疏浚完成情况	3.00	3.00
		(4)	橡胶坝建设完成情况	3.00	3.00
		(5)	泵房建设完成情况	3.00	3.00
	2、项目质量完成情况			6.00	3.25
		(1)	施工质量情况	3.00	1.50

“蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程项目”绩效评价得分表

指标				分值	枣庄高新技术产业开发区国土住 建局
合计				100.00	75.37
		(2)	工程完成率	3.00	1.75
	3、项目时效完成情况			2.00	0.00
		(1)	项目完成及时率	2.00	0.00
	4、项目成本完成情况			2.00	0.00
		(1)	项目预算执行率	2.00	0.00
四、效果				35.00	27.00
	1、经济效益			8.00	4.00
		(1)	对经济发展的促进作用	4.00	2.00
		(2)	产生间接经济效益	4.00	2.00
	2、社会效益			8.00	6.00
		(1)	对社会水利事业发展的促进作用	4.00	4.00
		(2)	水利工程形象提升情况	4.00	2.00
	3、生态效益			8.00	8.00
		(1)	对社会生态发展的促进作用	4.00	4.00
		(2)	对周边生态环境变化影响情况	4.00	4.00
	4、可持续影响			3.00	3.00
		(1)	使用期限	3.00	3.00
	5、满意程度			8.00	6.00
		(1)	受益群众满意度	4.00	2.00
		(2)	主管部门满意度	4.00	4.00

### 3、调查问卷表

#### 主管部门满意度问卷

#### 蟠龙河治理项目绩效评价调查问卷

尊敬的领导:

您好! 为了对枣庄高新技术产业开发区国土住建社会事业局(以下简称“高新区国土住建社会事业局”)蟠龙河治理项目绩效评价提供数据支撑,受枣庄高新技术产业开发区财政金融局委托,评价组对蟠龙河治理项目绩效情况开展调研。请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析,对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1. 您对蟠龙河治理工程的总体评价是?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  2. 您对蟠龙河治理工程建设施工等情况满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  3. 您对蟠龙河治理工程施工进度情况满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  4. 您对河道治理已完成部分的现场环境满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  5. 您对河道治理已完成部分的生产、生活环境改善满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  6. 您对河道治理已完成部分的安全隐患消除情况满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  7. 您对河道治理后泄洪能力满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  8. 您对项目实施前后的水质变化情况满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  9. 您对河道管理部门一年来的水环境治理方面的工作成效满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  10. 您对河道的保洁质量、绿化养护质量、附属设施养护质量满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  11. 您对河道治理迁建项目附着物补偿范围满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  12. 您对河道治理迁建项目附着物补偿金额满意吗?  
A.  满意                      B. 基本满意                      C. 不满意
  13. 您对河道治理迁建项目附着物补偿工作程序符合要求吗?  
A.  符合                      B. 基本符合                      C. 不符合
- 您对今后高新区国土住建社会事业局工作方面还有什么意见或建议?

工作单位:

姓名:

2022年 5月 26日

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

## 被拆迁补偿群体满意度问卷

### 蟠龙河治理项目绩效评价调查问卷

尊敬的领导:

您好! 为了对枣庄高新技术产业开发区国土建社会事业局(以下简称“高新区国土建社会事业局”)蟠龙河治理项目绩效评价提供数据支撑, 受枣庄高新技术产业开发区财政金融局委托, 评价组对蟠龙河治理项目绩效情况开展调研。请根据您的真实情况填写。我们保证问卷数据仅限于统计分析, 对个人信息将予以严格保密。感谢您的支持与配合!

1. 您对蟠龙河治理工程的总体评价是?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
2. 您对蟠龙河治理工程建设施工等情况满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
3. 您对蟠龙河治理工程施工进度情况满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
4. 您对河道治理已完成部分的现场环境满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
5. 您对河道治理已完成部分的生产、生活环境改善满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
6. 您对河道治理已完成部分的安全隐患消除情况满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
7. 您对河道治理后泄洪能力满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
8. 您对项目实施前后的水质变化情况满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
9. 您对河道管理部门一年来的水环境治理方面的工作成效满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
10. 您对河道的保洁质量、绿化养护质量、附属设施养护质量满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
11. 您对河道治理迁建项目附着物补偿范围满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
12. 您对河道治理迁建项目附着物补偿及时性满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
13. 您对河道治理迁建项目附着物补偿金额满意吗?  
A. 满意                       B. 基本满意                      C. 不满意
14. 您对河道治理迁建项目附着物补偿工作程序符合要求吗?  
A. 符合                       B. 基本符合                      C. 不符合

您对今后高新区国土建社会事业局工作方面还有什么意见或建议?

工作单位:

姓名:

年 月 日

山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

4、项目相关文件、制度

# 枣庄市生态环境局高新区分局文件

枣高环行审[2020]B-6号



枣庄市生态环境局高新区分局

关于枣庄高新财金投资控股集团有限公司蟠龙河南支及  
宏图河提升改造工程环境影响报告表的批复意见

枣庄高新财金投资控股集团有限公司：

经审查，对你公司报送的《蟠龙河南支及宏图河提升改造工程环境影响报告表》提出以下审批意见：

一、项目位于枣庄高新区兴城街道办事处，总投资41000万元，其中环保投资3140万元。总占地面积1.26km<sup>2</sup>，主要建设内容包括：1、按照50年一遇防洪标准对蟠龙河南支进行清淤疏浚，配套建设景观节点；在河道内设置三处橡胶坝；对蟠龙河南支车辆汽车服务点进行集中整治。2、按照50年一遇防洪标准对宏图河进行拓宽、清淤疏浚，配套建设景观节点；在河道内设置三处橡胶坝；新建复元三路，在复元三路西侧、湛江路南侧建设冷链物流园区，占地面积86671平



# 枣庄市自然资源和规划局

枣自资规函〔2020〕48号

## 关于蟠龙河南支及宏图河提升改造工程规划意见

枣庄高新财金投资控股集团有限公司：

你单位报来的《关于蟠龙河南支及宏图河提升改造工程规划意见的申请》有关资料收悉，经研究，该项目位于高新区范围，符合《枣庄市城市总体规划》，经研究，原则同意该项目，依法依规办理相关后续手续。

枣庄市自然资源和规划局



业主

## 蟠龙河南支水利提升改造工程主要材料价格 调查机制会议

# 会议纪要

(第1期)

---

时间：2020年10月26日

地点：中交三公局蟠龙河南支水利提升改造工程项目部会议室

主题：蟠龙河南支水利提升改造工程主要材料价格调查机制会议

参加单位及人员：

    枣庄高新国土住建社会事业局（以下简称业主）：提文国

    河南际龙工程技术咨询有限公司（以下简称监理）：庞道

玉

    山东嘉德致远工程管理有限公司：（以下简称审计）贺思

亮

    中交第三公路工程局有限公司（以下简称施工单位）：费银广、吴杰茂、王爱爱、李贺。

会议主要内容：

    2020年10月26日，工程参建各方在中交第三公路工程

编号 002

## 蟠龙河南支水利提升改造工程

### 监理例会

# 会议纪要

时间：2020年11月23日

地点：中交三公局蟠龙河南支水利提升改造工程项目部会议室

主题：蟠龙河南支水利提升改造工程第二次工程监理会议

参加单位及人员：

枣庄高新国土住建社会事业局（以下简称业主）：提文国


河南际龙工程技术咨询有限公司（以下简称监理）：庞道玉、  
赵强

山东嘉德致远工程管理有限公司（以下简称审计）：刘冲

中交第三公路工程局有限公司（以下简称施工单位）：费银广、  
李刚、宿小合、张福庆、陈稳、任浩

(后附会议签到表)

## 5、项目现场调查照片

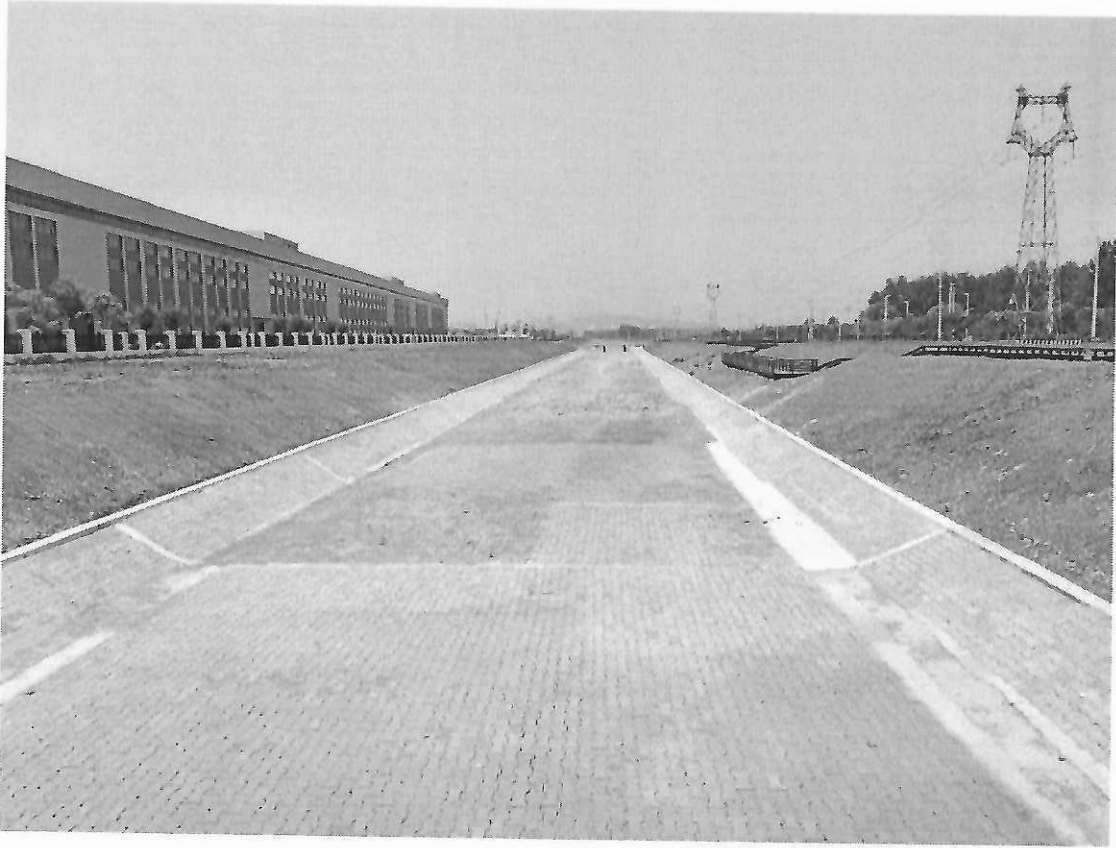




6、其他

4 潘龙河治理项目预算资金情况表

1	项目预算资金（元）	13,000,000.00
2	实际到位资金（元）	13,000,000.00
	其中：中央财政资金	
	省级财政资金	
	市级财政资金	
	区级财政资金	13,000,000.00
3	实际支出（元）	9,322,881.40
4	剩余资金	3,677,118.60

填表人：李娜

摘要	预算单位	业务科类	招标金额	招标余额	已确认支付数	未确认支付数	合同总金额	已履行合同数	已履行合同数	招标未付款数	招标未付款数	合同金额	功能科目	项目名称	资金性质	资金来源	下达时间
基本支出	001029 管委会-国土住建	区财政或区经济社	13,000,000.00	387,566.40	3,322,881.40	3,677,118.60	3,677,118.60	16,752,207.40	3,677,118.60	3,677,118.60	3,677,118.60	3,677,118.60	220004 水利和海洋	区本级一般公共预算支出	财政资金	区本级一般公共预算支出	2021.02.03




# 4 蟠龙河治理绩效目标申报表

项目基础信息					
单位名称	国土住建局本级	项目编号	112002-2021-0015	项目名称	蟠龙河治理
立项年度	2021	业务年度	2021	开始时间	2021-01-01
结束时间	2021-12-31	项目类别	基础设施建设	预算分类	部门预算
归口处室	经济社会科	功能科目	[2120804]农村基础设施建设支出		
项目扩展信息					
是否政府采购	否				
项目资金申请 (万元)	资金总额:	3,000 万元			
	财政拨款:	3,000 万元			
	非税:	0 万元			
	其他:	0 万元			
项目简介	蟠龙河南支改造工程				
项目测算依据	按合同及工程实际结算				
项目立项情况					
项目立项依据	1、资金拨付				
项目申报可行性	符合规划要求				



项目申报必要性		保护水资源并促进环境保护				
项目绩效目标						
长期目标		年度目标				
福龙河水系得到有效整治		完成 5 千米河道改造任务				
其他说明的问题 无						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容		实施开始时间	实施结束时间		
1	福龙河治理		2021-01-01	2021-12-31		
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	年度改造任务	5	千米
2	产出	项目产出	时效指标	施工任务是否按时进行	按时	
3	产出	项目产出	质量指标	按照时间节点完成施工任务	是	
4	产出	项目产出	成本指标	2021 年度预计拨款	3000	万元
5	效果	项目效益	经济效益	拉动相关产业发展, 促进人口就业	是	
6	效果	项目效益	社会效益	保障河道得到有效治理	是	
7	效果	项目效益	生态效益	提升环境污染防治	是	
8	效果	项目效益	可持续影响	促进水资源可持续利用, 稳步提升环境保护	是	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	95	%

## 蟠龙河南支水利提升改造工程



### 一、项目简介：



蟠龙河，发源于枣庄市柏山飞来泉，由东向西汇至大沙河后进入微山湖，总长46km（至薛微界40.3km），流域面积233km<sup>2</sup>。流经枣庄市薛城区、高新区、新城区北部，上游有蟠龙河南、北两支流，蟠龙河北支和南支在在高新区兴城办事处石沟营村北交汇，交汇口以下至官庄分洪道称为蟠龙河。蟠龙河和官庄分洪道在陶庄镇皇殿村东汇合，下游至入湖口河段称薛城大沙河，最终流入微山湖。通过近几年的分段历次河道治理后，店韩路段至薛微界段23.7km，现在基本满足20年一遇防洪标准。蟠龙河南支发源于南北于、东西横山口山区以及黑峪水库，干流全长16.2km，流域面积95.92km<sup>2</sup>，流经南北于、田庄、南石镇政府、东西夹埠、蒋庄，在石沟营村北附近和北支交汇。本次蟠龙河南支改造工程范围为张范政府交通桥（复兴路）至店韩路下游100m处，治理长度约5km。

### 二、完成工作内容：

截止2021年底，实际完成土方开挖约15万立方米、石方破碎约17万立方米、石方开挖约17万立方米，清淤约1.2万立方米、碎石回填约5000吨、河道防渗约9万平方米、橡胶坝3座，处理长度约56.67米、泵房3座，每座建筑面积约60.97平方米（内部含机电设备及安装）、支流闸口2座（内部含金属设备安装）、园路铺装约2000平方米、绿化种植约45棵。

## 开工报告

工程名称：高新区蟠龙河支线迁改工程

工程名称	高新区蟠龙河支线迁改工程	建设单位	枣庄高新财金投资控股集团有限公司
计划开工时间		计划竣工时间	
施工单位	枣庄力源送变电工程有限公司高新富源分公司		
<p>工程概况：</p> <p>本项目建设范围蟠龙河支线线路迁移电气施工。</p>			
<p>建设单位：</p> <div style="text-align: center;">  <p>(签/章)</p> </div> <p>日期：_____</p>	<p>施工单位：</p> <div style="text-align: center;">  <p>(签/章)</p> </div> <p>日期：_____</p>		

# 建设工程施工合同

住房和城乡建设部 制定  
国家工商行政管理总局

## 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 枣庄高新财金投资控股集团有限公司

承包人(全称): 中交第三公路工程局有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就蟠龙河南支水利提升改造工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

### 一、工程概况

1. 工程名称: 蟠龙河南支水利提升改造工程施工。
2. 工程地点: 枣庄高新区蟠龙河南支(西起复元三路,东至复兴路)。
3. 工程立项批准文号: 2020-370491-76-03-006408。
4. 资金来源: 自筹。
5. 工程内容: 包括蟠龙河南支的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、木桩护坡、道路铺装、防腐木铺装、绿化、活动广场及其他民生配套设施建设等。  
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。
6. 工程承包范围: 包括蟠龙河南支的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、木桩护坡、道路铺装、防腐木铺装、绿化、活动广场及其他民生配套设施建设等。

### 二、合同工期

计划开工日期: 2020年8月20日。

计划竣工日期: 2020年12月18日。

工期总日历天数: 120日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合 国家验收规范合格 标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为:人民币(大写) 暂定捌仟万元(暂定¥80000000.00元); 工程总造价让利8%(第12.1约定主要材料不参与让利)。

2. 合同价格形式: 按定额计价。

3. 增值税税金的计算方法: 一般计税方法。

### 五、项目经理

承包人项目经理: 张毅。

### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书(如果有);

- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

### 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招标投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

### 九、签订时间

本合同于 2020 年 7 月 25 日签订。

### 十、签订地点

本合同在 山东省枣庄市 签订。

### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

### 十二、合同生效

本合同自 签字盖章 生效。

### 十三、合同份数


本合同一式壹拾贰份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执陆份。



法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 



承包人：

法定代表人或其委托代理人：  
(签字) 

# 建设工程监理合同

(GF-2012-0202)

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

二〇二〇年七月

## 第一部分 协议书

委托人(全称): 枣庄高新财金投资控股集团有限公司

监理人(全称): 河南际龙工程技术咨询有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致,订立本合同。

### 一、工程概况

1. 工程名称: 蟠龙河南支水利景观提升改造工程监理;
2. 工程地点: 枣庄市高新区蟠龙河南支(西起复元三路,东至复兴路);
3. 工程规模: 全长8千米,治理区域面积0.24平方千米;
4. 工程概算投资额或建筑安装工程费: 约8000万元。

### 二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

### 三、组成本合同的文件

1. 协议书;
2. 中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3. 投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
4. 专用条件;
5. 通用条件;
6. 附录即:

附录A 相关服务的范围和内容

附录B 委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

### 四、总监理工程师

总监理工程师姓名: 邓峰, 身份证号码: 411102197903042058, 注册号: 41002893。

### 五、签约酬金

签约酬金: 监理费取费基数暂按工程投资额8000万元,最终以实际审定值乘费率为准,监理费费率按0.9%,即 $8000 \times 0.9\% = 72$ 万元,本工程暂定监理费为72万元。



# 山东省建设项目备案证明



项目单位  
基本情况

单位名称 枣庄高新财金投资控股集团有限公司

枣庄高新区光明西路

单位注册地 1677号浙商大厦19层 法定代表人 王福振  
西区

项目代码 2020-370491-76-03-006408

项目名称 蟠龙河南支及宏图河水利提升改造工程

建设地点 370491 ( 枣庄高新区 )

项目  
基本  
情况

建设规模和内容

蟠龙河南支(西起复元三路,东至复兴路)全长8km。按50年一遇防洪标准对其进行清淤疏浚;配套建设景观节点;在河道内设置三处橡胶坝;对蟠龙河南支两侧汽车服务点进行集中整治。宏图河(南起光明路、北至枣曹路)全长3.1km。拆除宏图河两侧护栏、道路(复元三路)及两侧部分建筑,对宏图河拓宽、清淤疏浚至50米,使其满足50年一遇防洪标准。在宏图河西侧新建复元三路(含道路桥梁3座)。配套建设景观节点;在河道内设置三处橡胶坝;在复元三路西侧、湛江路南侧地块建设冷链物流园区,占地86671平方米,总建筑面积150000平方米,对拆除物流配送企业及店铺进行回迁安置,多余店铺对外出租、出售。

钟徽新 以投入过程狂

总投资 41000万元

建设起止年限 2020年至2022年

项目负责人 靳峰

联系电话 13616328989

备注

# 景观工程设计合同

工 程 名 称: 枣庄高新区蟠龙河南支蓄水河段景观改造工程

设计项目

工 程 地 点: 山东枣庄

合 同 编 号: LA20-0380

(由设计人编填)

设计证书等级: 建筑工程设计甲级、风景园林工程设计专

项甲级、城乡规划编制乙级

发 包 人: 枣庄高新财金投资控股集团有限公司

设 计 人: 中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司

签 订 日 期: 2020年6月26日

中华人民共和国建设部

国家工商行政管理局 监制



# 中标通知书

项目编号: SDJR-2020-C080518

中交第三公路工程局有限公司:

蟠龙河南支水利景观提升改造工程位于枣庄高新区蟠龙河南支(西起复元三路,东至复兴路),工程规模约8000万元。该项目于2020年6月24日公开开标后,已完成评审工作,现确定你公司为一标段(施工标段)中标人。中标范围:蟠龙河南支的清淤疏浚、橡胶坝、泵站、景观建设、木桩护坡、道路铺装、防腐木铺装、绿化、活动广场、景观小品及其他配套设施建设施工; 中标金额: 工程总造价让利8%; 工期: 120日历天; 质量等级: 合格; 建造师姓名: 张毅。


请你公司在《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规、法规规定的期限内,按招标人要求的时间、地点与招标人签订合同。

招标人: 枣庄高新财金投资控股集团有限公司

代理机构: 山东金润建设咨询有限公司

日期: 2020年6月28日





# 营业执照


(副本)

5-4

统一社会信用代码

91370102MA3U1A4PX6

扫描二维码登录  
国家企业信用信息公示系统  
了解更多登记、许可、监  
管信息



名称 山东舜天信诚会计师事务所(普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

肖东义


执行事务人  
经营范围

许可项目：从事会计师事务所业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

成立日期 2020年12月03日

合伙期限 2020年12月03日至 年 月 日

主要经营场所 山东省济南市历下区花园路189-2号畅远商座甲座303



登记机关


2020年12月03日

证书序号: 0015779

### 说明


- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:



二〇〇一年八月 日

中华人民共和国财政部制



## 会计师事务所 执业证书

名称: 山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖东义

主任会计师:

经营场所: 山东省济南市历下区花园路205号华鑫商务1号楼三楼

组织形式: 特殊普通合伙

执业证书编号: 37010041

批准执业文号: 鲁财会协字[2001]28号

批准执业日期: 2001年04月19日

